



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilita'
Ufficio Lavori Pubblici

CC 48/21_MIT.PONTI

OGGETTO:


SP dell'Ufficio Viabilità centro - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale per i ponti della SP 56 di Barbagelata e della SP 14 di Davagna

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Nicola Ghio <i>N. Ghio</i>	PROGETTISTI: Ing. Chiara Pitruzzelli <i>Pitruzzelli Chiara</i> Arch. Chiara Truffelli <i>Chiara Truffelli</i>		ALLEGATO 11
			TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Francesca Villa <i>F. Villa</i>		SCALA
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesca Villa <i>F. Villa</i>		DATA
CONTROLLATO	DATA <i>11 NOV. 2024</i>	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA <i>11 NOV. 2024</i>	AGGIORNATO	DATA

Attività	Durata gg.
	150
SP56 - PONTE km.00.020 - Consegna lavori	73
Preparazione cantiere	5
Asportazione del conglomerato bituminoso sulle corsie di marcia e sul marciapiede di valle	15
Rimozione n.2 giunti e/o lamierini esistenti.	7
Pulizia accurata della superficie, stesa della guaina impermeabilizzante	20
Posa di n.2 giunti	10
Stesa conglomerato bituminoso su corsie e marciapiede di valle. Binder e tappeto sulle carreggiate e tappeto d'usura sul marciapiede di valle	12
Tracciamento segnaletica orizzonale	2
Pulizia e rimozione cantiere	2
SP14 - PONTE km.00.005 - Consegna lavori	77
Preparazione cantiere	5
Asportazione del tappeto d'usura sulle corsie di marcia e asportazione della massiciata nell'intorno dei giunti e in corrispondenza dei nuovi pozzetti e dei rispettivi collegamenti	15
Rimozione n.2 giunti e/o lamierini esistenti.	7
Pulizia accurata della superficie nell'intorno dei giunti e posa n.2 nuovi giunti	15
Realizzazione di n.3 pozzetti e adeguamento e ripristinio del sistema di smaltimento acque meteoriche compreso il convogliamento acque in corrispondenza giunti	15
Stesa del tappeto d'usura sulle carreggiate del ponte e sulla porzione di strada di collegamento al ponte lato Davagna	10
Tracciamento segnaletica orizzonale	5
Pulizia e rimozione cantiere	5

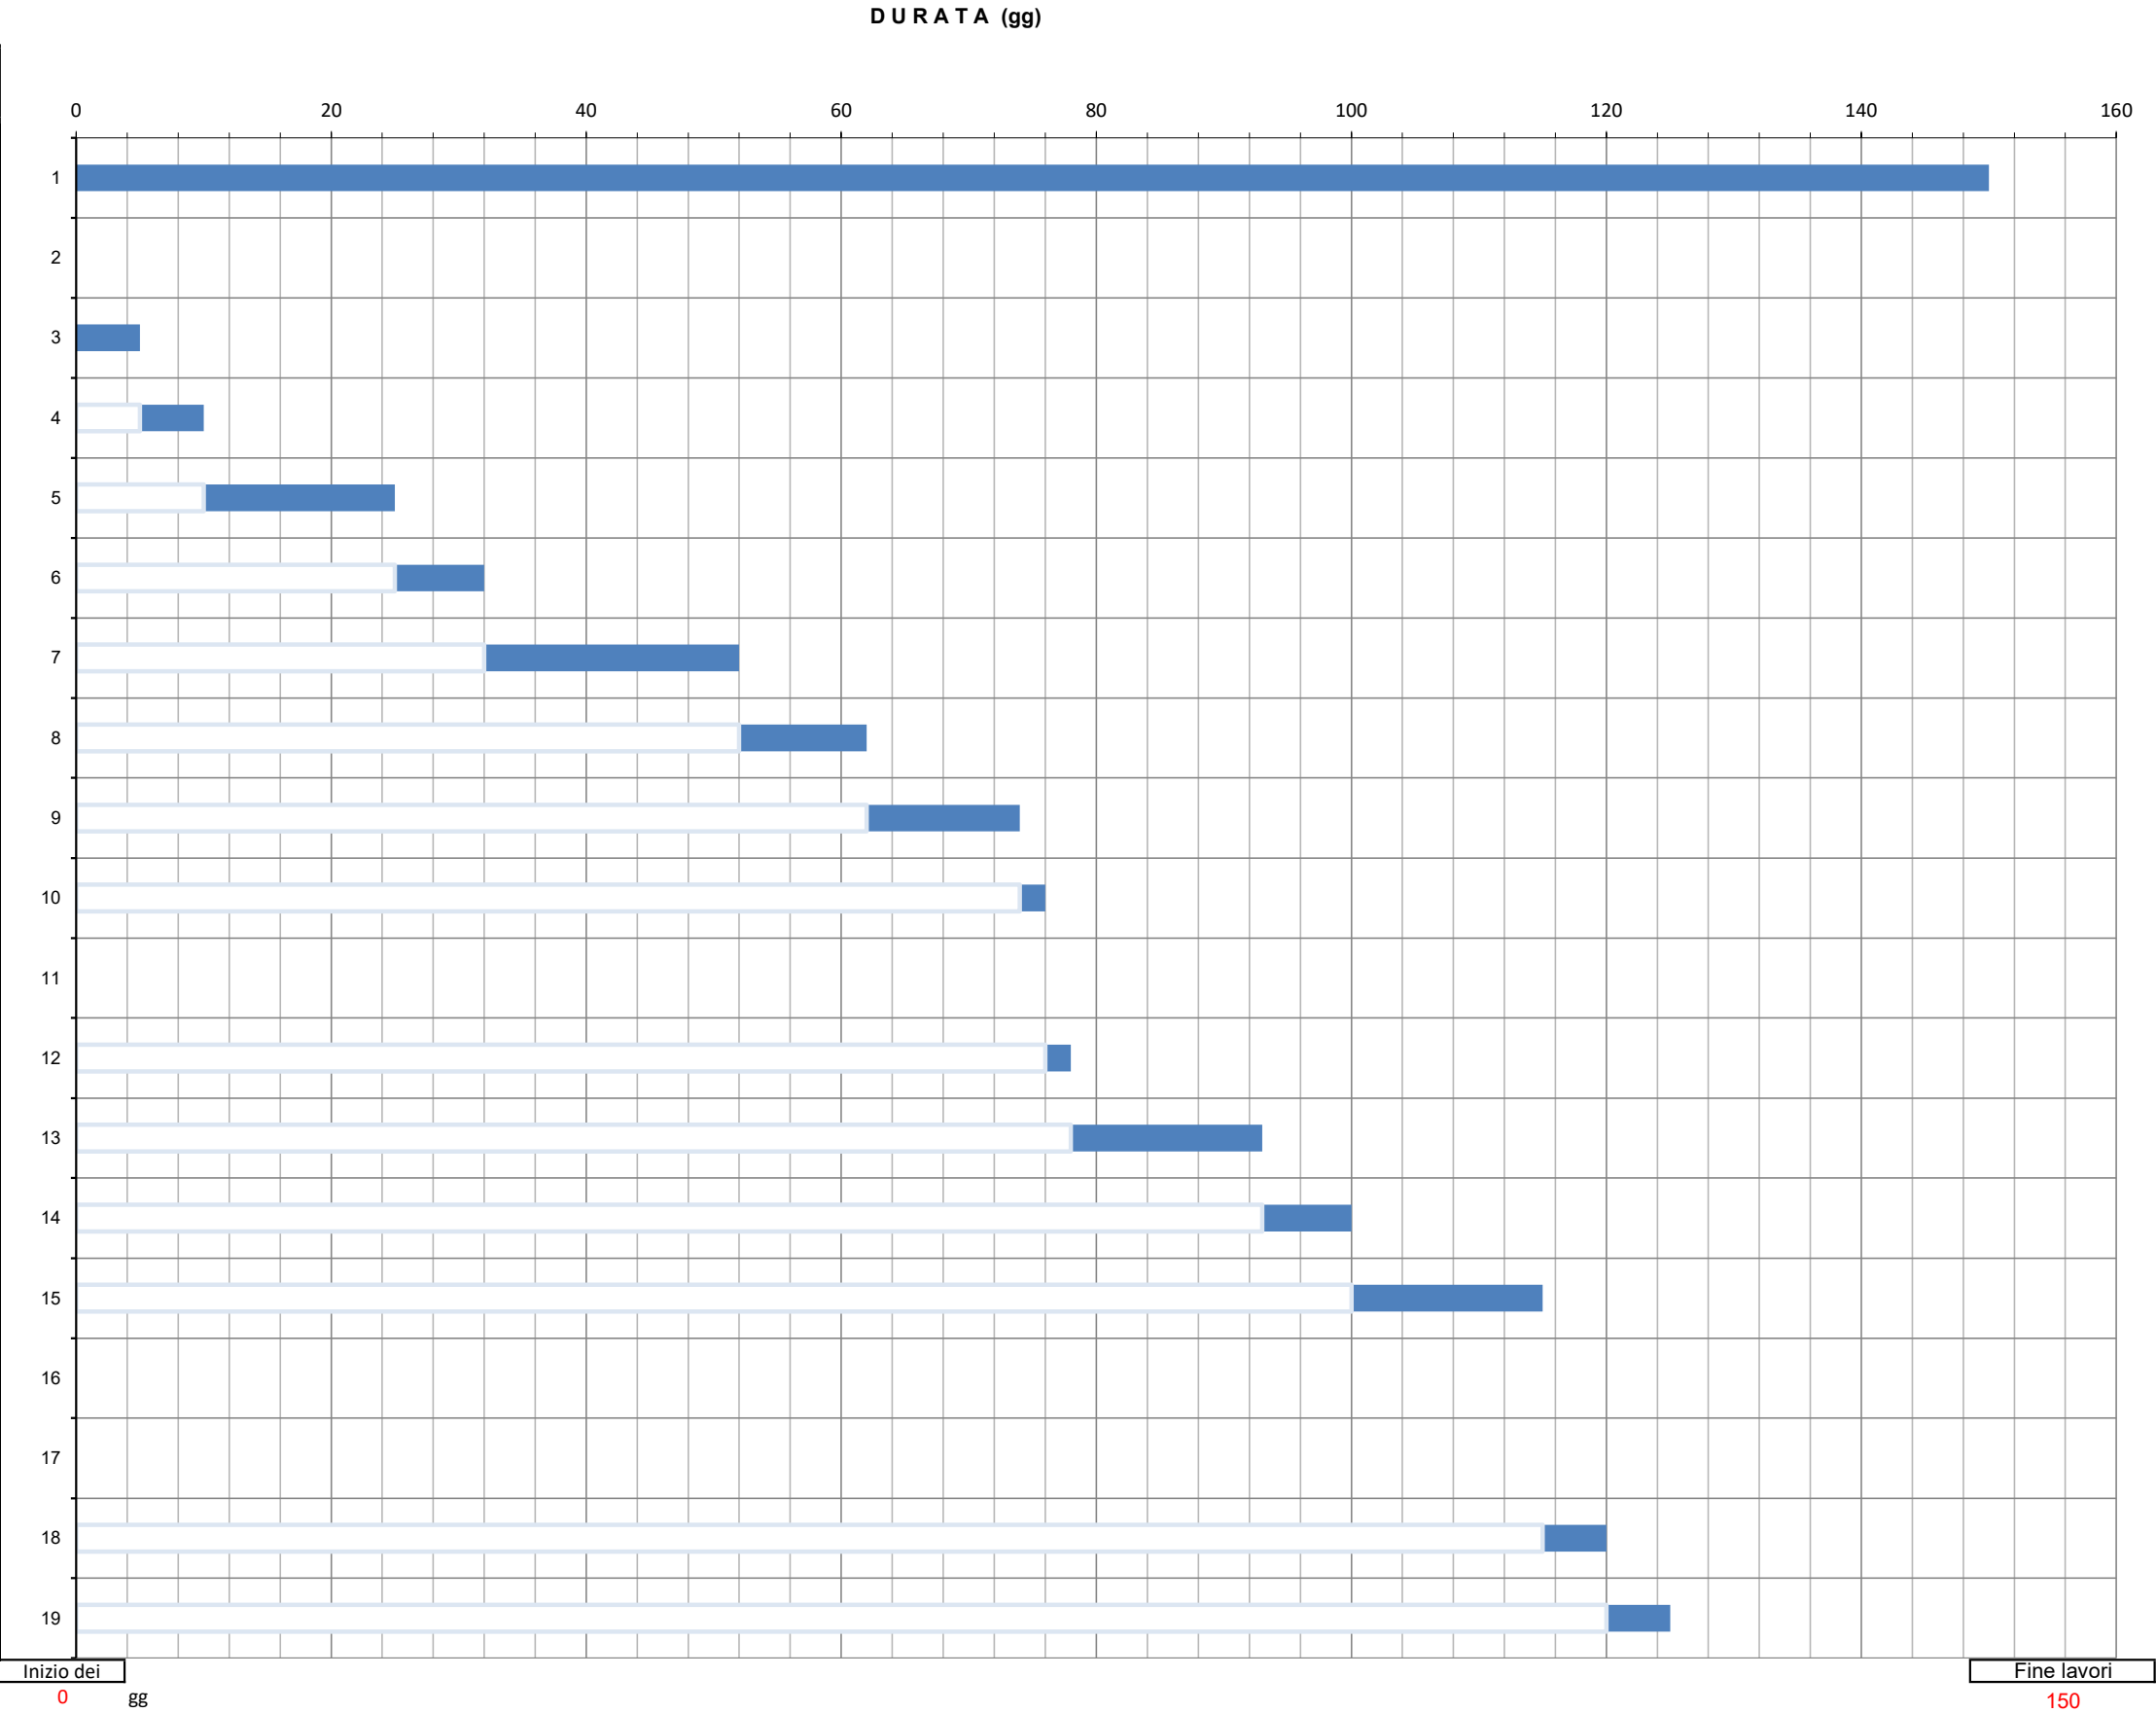

150

naturali consecutivi
