



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3351/2025

**OGGETTO: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - LAV.23.04 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO
L'I.I.S PRIMO LEVI DI VIA TRENTO E TRIESTE 87 - RONCO SCRIVIA (GE) - CUP
D94I20000040001 - CIG A006A28B28 - PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI
DELL'ART. 120 CO. 1 LETT. B), COMMA 5 E COMMA 7 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3303_2025.docx

Hash:

86979BED8A97CA2A5B4BB742639853E128A5EA315C748D9C13ECB7F70D1D2241A1473A3CDAC5F3
73FBAC92E66EB7C1D703DCFF857485306B86AD200546040BF9

Nome file allegato: LAV.23.04 - QTE di Confronto_rev1.pdf.p7m

Hash:

C69AA898178A8351DA5094AE2E2E3876752415A1297D5A2EC0B71F71D9059C3996690271FF48C74
EFFF894AD02EA2C49E33A672D974D10E579DC384157C1889D

Nome file allegato: LAV.23.04 - Relazione Rup ammissibilità modifica contratto rev 1.pdf.p7m

Hash:

675A9EB949F795325611DB4540CEE86686D9F655B44CA1E0D7168E50B8D72C8CC0EB4E2A24BFFB3
5C1B5D8888AF71797D175B649BC26DD637BE47E77C0087A3D

Nome file allegato: PRAMM1_Elenco elaborati.pdf

Hash:

C3C36317FAE1D5A0F64C7B37DC7202183336F67FCB16938F26D427DE7CAAAF41204F1D744A961A2
33BBB566A389F3A052A715393917C5F2711C4684538D0CEFB

Nome file allegato: LAV.23.04 - Atto di sottomissione_VAR1.pdf.p7m

Hash:

CA403454B456A7E8A58C4C18CD59A043B6F97EDEF8ECE62813A542864D7B728F415FF0103290FDD
4A0A70B1842E6C888365BB81E3E81CCE66CA62A02261A41F5

Nome file allegato: LAV.23.04 - Nuove tabelle e categorie_rev1.pdf.p7m

Hash:

25CCFD37697816AB4B262BD1679E60B8FEA3E3D152D4882473B78A5B2A02AA71065F1472E08C457
C0DABC0055C7B252FBF57168E525A4E0D5B33129AFFECDF29

Nome file allegato: PRAMM11_Quadro comparativo.pdf.p7m

Hash:

EAD695A3ED97C2FF576A4E814EA174878715267985D4701536396CC2B281494C8BB784F9AB039FD
C54B30A9EA760A83D9975AADD8B9E693FA608A3DD4C00F62D

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 3351/2025

**Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - LAV.23.04 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
PRESSO L'I.I.S PRIMO LEVI DI VIA TRENTO E TRIESTE 87 - RONCO SCRIVIA
(GE) - CUP D94I20000040001 - CIG A006A28B28 - PRESA D'ATTO MODIFICA AL
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 1 LETT. B), COMMA 5 E COMMA 7
LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023.**

In data 28/11/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;


Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento di "Adeguamento sismico presso l'I.I.S. Primo Levi di Via Trento e Trieste n. 87 - Ronco Scrivia (GE). CUP D94I20000040001";
- con atto dirigenziale n. 752/2023 del 03/04/2023 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Angelo Allodi quale Responsabile Unico del Procedimento;






CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con DGR 100/2023 del 09/02/2023 la Regione Liguria ha approvato gli interventi ammissibili da proporre al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione per il PNRR;
- con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 320 del 2022 e Decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 10 marzo 2023, n. 17 sono stati approvati ed ammessi a finanziamento gli interventi proposti anche da Regione Liguria;
- tra gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il summenzionato decreto ministeriale è previsto l'intervento *"PNRR M4.C1.I3.3 - Finanziato dall'Unione europea Nextgenerationeu - LAV.23.04 - Intervento di Adeguamento sismico presso l'I.I.S. Primo Levi di Via Trento e Trieste n. 87 - Ronco Scrivia (GE). CUP D94I20000040001"* di importo complessivo € 2.249.520,00 a valere sul finanziamento PNRR Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 *"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"*;
- con istanza n. 3566 inoltrata in data 02/04/2024, tramite portale ministeriale FUTURA, l'Ente Città Metropolitana di Genova chiedeva all'Unità di Missione competente del summenzionato finanziamento PNRR la riduzione del finanziamento concesso da € 2.249.520,00 a € 1.410.000,00;
- con nota n. 13361 del 29/01/2025, in risposta all'istanza n. 3566 già menzionata, e trasmessa tramite portale FUTURA, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha accolto la richiesta di riduzione del finanziamento concesso a € 1.410.000,00;
- con Decreto del 31/08/2020 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e relativo allegato 2 con l'elenco delle spese di progettazione in graduatoria, si è disposta l'assegnazione del contributo di euro 90.995,00 per l'intervento *"SER.21.00001 Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di adeguamento sismico - IIS-Levi Primo – Sede Corso Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia"*, approvato in via definitiva con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020;
- con atto dirigenziale n. 976/2021 del 11/05/2021 è stato affidato all'operatore economico Società di Ingegneria Ve.Ma. Progetti S.r.l. - Montesilvano il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento *"SER.21.00001 Adeguamento sismico – IIS Levi Primo – Sede Corso Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia. CIG 8679794898. CUP D94I20000040001"* per un importo di euro 34.063,46 oneri fiscali esclusi (euro 41.557,42 oneri fiscali inclusi), importo cofinanziato attraverso fondi del Ministero dell'Interno riferiti all'intervento *"LAV.23.04 - Intervento di adeguamento sismico presso l'I.I.S. Primo Levi di Via Trento e Trieste 87 – Ronco Scrivia (GE). CUP D94I20000040001"*;
- con atto del RUP n. 1393/2023 del 20/06/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo all'intervento *"PNRR M.4 C.1 I.3.3 - LAV.23.04 Intervento di adeguamento sismico presso l'I.I.S. Primo Levi di Via Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia (GE). CUP D94I20000040001"*;
- con atto dirigenziale n. 2408/2023 del 23/10/2023 si è preso atto del certificato di verifica di conformità del servizio relativo all'incarico *"SER.21.00001 Progettazione definitiva ed esecutiva"*



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

dell'intervento di adeguamento sismico – IIS Levi Primo – Sede Corso Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia. CIG 8679794898. CUP D94I20000040001 per un importo di € 34.063,46 oneri fiscali esclusi (euro 41.557,42 oneri fiscali inclusi);

- con atto del RUP n. 1427/2023 del 23/06/2023 sono state approvate le modifiche al Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo relativo all'intervento *“PNRR M.4 C.1 I.3.3 - LAV.23.04 Intervento di adeguamento sismico presso l'I.I.S. Primo Levi di Via Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia (GE). CUP D94I20000040001”*;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1435/2023 del 26/06/2023 si è preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo, avviata la procedura di scelta del contraente ed approvati lo schema di lettera di invito e gli allegati relativi all'intervento *“PNRR M4.C1.I3.3 - Finanziato dall'Unione europea Nextgenerationeu - LAV.23.04 - Intervento di Adeguamento sismico presso l'I.I.S. Primo Levi di Via Trento e Trieste n. 87 - Ronco Scrivia (GE). CUP D94I20000040001”*;
- con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2043/2023 del 14/09/2023 sono stati aggiudicati i lavori relativi all'intervento *“PNRR M4.C1.I3.3 - Finanziato dall'Unione europea Nextgenerationeu - LAV.23.04 - Intervento di Adeguamento sismico presso l'I.I.S. Primo Levi di Via Trento e Trieste n. 87 - Ronco Scrivia (GE). CIG. A006A28B28. CUP D94I20000040001”* all'operatore economico ATI Geo Prospezioni / Di Giuseppe Osvaldo S.r.l. di Teramo per un importo contrattuale di € 731.731,37 oneri fiscali esclusi (€ 804.904,507 oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 22,878% ed è stato approvato il Quadro Tecnico Economico post aggiudicazione;
- l'operatore economico ha sottoscritto in data 12/10/2023 il contratto Rep. n. 237 avente ad oggetto i lavori relativi all'intervento *“PNRR M4.C1.I3.3 - Finanziato dall'Unione europea Nextgenerationeu - LAV.23.04 - Intervento di Adeguamento sismico presso l'I.I.S. Primo Levi di Via Trento e Trieste n. 87 - Ronco Scrivia (GE). CIG. A006A28B28. CUP D94I20000040001”*;
- in data 23/11/2023 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti della pratica;
- con atto dirigenziale n. 826/2024 del 29/03/2024 è stato affidato all'Ing. Antonio Di Carlo in avvalimento con Archimede S.r.l. il servizio *“PNRR M.4C.1I.3.3 “Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” - finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu - Collaudo statico e tecnico amministrativo per l'intervento di adeguamento sismico dell'I.I.S. Levi Primo, sito in Corso Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia (GE) - CUP D94I20000040001 - CIG B0F07EDA4B”*, per un importo di € 29.672,63 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 37.648,63 oneri previdenziali e fiscali inclusi) ed approvato il QTE rimodulato;
- con atto dirigenziale n. 1006/2024 del 22/04/2024 è stato affidato all'operatore economico InGenova S.r.l. (P.IVA 02463530994) il servizio *“LAV.23.04.SER.02 Servizio di direttore operativo per le opere strutturali a supporto del direttore lavori per l'intervento PNRR M.4C.1I.3.3 Adeguamento sismico dell'I.S.S. Primo Levi, Ronco Scrivia. CUP D94I20000040001. CIG B10A517E74”*, per un importo di € 5.024,24 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 6.374,76 oneri previdenziali e fiscali inclusi);



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio


Servizio Edilizia

- dato atto che i lavori sono stati sospesi in data 10/06/2024, come da Verbale agli atti d'ufficio;
- con atto dirigenziale n. 1564/2025 del 06/06/2025 è stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico relativo all'intervento *"PNRR M4.C1.I3.3 - Finanziato dall'Unione europea Nextgenerationeu - LAV.23.04 - Intervento di Adeguamento sismico presso l'I.I.S. Primo Levi di Via Trento e Trieste n. 87 - Ronco Scrivia (GE). CUP D94I20000040001"*;
- con atto dirigenziale n. 3139/2025 del 07/11/2025 è stato rimodulato il QTE per diritti di segreteria per scia in favore del comune di Ronco Scrivia (GE);

Dato atto che con Protocollo Generale n. 65329 del 30/10/2025 (e successive integrazioni del 18/11/2025) è pervenuta alla Stazione Appaltante la proposta, da parte dell'Operatore Economico, di variazione migliorativa ai sensi dell'art. 120 commi 7 lett c) e 5 (modifica non sostanziale) del D.lgs. 36/2023;

Richiamata la nota prot. n. 70622/2025 del 25/11/2025 con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione, agli atti della pratica, relativa alla modifica del contratto in argomento per un importo contrattuale in diminuzione di € 1.570,15 oneri fiscali esclusi (€ 1.727,17 oneri fiscali inclusi) per un nuovo importo contrattuale di € 730.161,22 oneri fiscali esclusi (€ 803.177,34 oneri fiscali inclusi) e così costituita:

- a) documentazione sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'appaltatore trasmessa con nota prot. 70499/2025 del 24/11/2025, e composta da:
- } Proposta del DL di modifica al contratto;
 - } Nuova Tabella Categorie omogenee/contabili;
 - } Nuova Tabella Categorie Lavorazioni;
 - } Quadro comparativo di modifica al contratto;
 - } Quadro Economico Generale di raffronto;
 - } Atto di sottomissione;
 - } Elaborati grafici del progetto esecutivo di variante, elencati nel file *"PRAMM1_Elenco elaborati.pdf"* allegato
- b) Relazione del RUP del 25/11/2025 di ammissibilità della modifica al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b), comma 5 e comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con la quale lo stesso autorizza, dal punto di vista sia tecnico che giuridico, la modifica proposta dal Direttore Lavori, e così articolata:
- 1) *Lavorazioni che rientrano nelle previsioni dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di interventi conseguenti alla sopravvenuta necessità di lavori non previsti nell'appalto iniziale ma finalizzati alla messa in sicurezza dell'edificio.*





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio


Servizio Edilizia

- Trattasi di opere per l'adeguamento antincendio finalizzate ad un miglioramento della sicurezza dell'edificio relativamente agli aspetti antincendio e all'ottenimento della SCIA di prevenzione incendi;
- 2) *Lavorazioni che rientrano nelle previsioni dell'art. 120 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in quanto proposta migliorativa da parte dell'appaltatore:*
- si propone la modifica degli interventi previsti per l'adeguamento sismico delle strutture, al fine sia di semplificare le lavorazioni sia di incrementare l'indice di sicurezza sismica finale;
 - viene proposto, diversamente dal progetto esecutivo originario, il mantenimento della copertura esistente, in quanto, a seguito di approfondimenti e delle estese demolizioni già effettuate in cantiere, è stata effettuata una differente valutazione del ruolo strutturale dei muri nel sottotetto.
- 3) *Lavorazioni che rientrano nelle previsioni dell'art. 120 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, in quanto concretano la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori con interventi che possono essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera:*
- viene proposto, a parziale modifica del progetto esecutivo originario, la realizzazione di scala antincendio esterna e correlate opere antincendio a servizio di nuova aula magna

Dato atto che:

- in data 21/11/2025 l'appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione, accettando i patti e le condizioni in esso contenute, così come sopra descritte;
- per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, non vengono concessi giorni in aggiunta a quelli previsti nel contratto;
- il Quadro Tecnico Economico generale di progetto che si viene a determinare a seguito della modifica in argomento risulta così articolato:

LAVORI		QTE DD 3139/2025	QTE VARIANTE
a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetto a ribasso)	355.160,30	348.547,21
b)	Importo per la manodopera (non soggetto a ribasso)	305.395,02	280.358,74
c)	Oneri della sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	16.470,21	13.918,11






CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

d)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	54.705,84	87.337,16
TOTALE LAVORI		731.731,37	730.161,22
SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Lavori esclusi dall'appalto iva esclusa	13.500,00	13.500,00
2	Imprevisti esclusa iva	70.000,00	70.000,00
3	Spese Tecniche per Progettazione definitiva ed esecutiva - cofinanziamento MINT (SER.21.00001) - oneri previdenziali e fiscali inclusi	41.557,42	41.557,42
4	Spese Tecniche per Direzione Lavori (oneri previdenziali e fiscali esclusi)	100.000,00	100.000,00
5	Spese professionali per l'esecuzione dell'appalto (oneri previdenziali e fiscali esclusi)	49.304,83	49.304,83
6	Spese di Gara e Pubblicazioni	7.000,00	7.000,00
7	Spese Tecniche per Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo (oneri previdenziali e fiscali esclusi)	29.672,63	29.672,63
8	Spese per Autorità di Vigilanza	525,00	525,00
9	Incentivi per attività tecniche svolte da dipendenti della P.A. (art.45 c.1,2,3,4,5 D.Lgs. 36/23) – quota 80%	13.393,42	13.393,42
	Incentivi per attività tecniche svolte da dipendenti della P.A. (art.45 c.6,7 D.Lgs. 36/23) – quota 20%	3.348,35	3.348,35
10	Somme per assunzioni a tempo determinato (D.L. 80/2021)	80.000,00	80.000,00
11	IVA 22% su altre voci e arrotondamenti di € 394,21	69.724,25	70.035,71
12	IVA 10% sui lavori	73.173,14	73.016,12
13	Cassa su spese tecniche (4%)	7.159,10	7.159,10
14	Spese laboratorio iva esclusa	45.500,00	46.915,71
15	Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione	75,00	75,00
16	<i>Ribasso compresa IVA 10%</i>	115.892,91	115.892,91



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	719.826,05	721.396,20
IMPORTO QUADRO TECNICO ECONOMICO	1.451.557,42	1.451.557,42

Dato atto che l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 1.451.557,42 trova copertura finanziaria nel modo seguente:

- € 1.410.000,00 finanziamento incluso nel PNRR (finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU – missione 4, componente 1, investimento 3.3) e assegnato dapprima con DMIUR n. 62 del 10/03/2021 e successivamente, in forma definitiva, con DM 217 del 15/07/2021;
- € 41.557,42 *“Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126”* assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020;

Dato atto che, per quanto concerne gli aspetti contabili occorre procedere alla riduzione dell'impegno di spesa n. 210/2024 dell'operatore ATI Geo Prospezioni / Di Giuseppe Osvaldo S.r.l., dell'importo di € 1.727,17 con relativa reintegrazione sulla prenotazione n. 193/2024, sul capitolo di bilancio 04022.02.2003981;

Dato atto che la modifica contrattuale di cui sopra:

- conferma il conseguimento di target e milestones e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- sarà comunicata all'Unità di missione per il PNRR entro 30 giorni dall'adozione, in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025, affinché la stessa Unità possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità della variante e delle relative spese. La nota specifica inoltre che non sussiste l'obbligo, in capo alla Stazione appaltante, di attesa di riscontro formale da parte dell'Unità di missione per il PNRR, potendo l'ente attuatore procedere con le operazioni successive all'atto di variante, fermo restando che *“l'ammissibilità delle spese rimane subordinata all'esito positivo dei controlli successivi e di quelli eseguiti in fase di rendicontazione”*;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città Metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- non sono stati segnalati casi di conflitti di interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dirigenti che partecipano alla presente procedura ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:


- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato.

Per le motivazioni di cui in premessa,

DISPONE

- 1) **di prendere atto della modifica al contratto relativa all'intervento "PNRR M.4 C.1 I.3.3 LAV.23.04 Intervento di adeguamento sismico – I.I.S. Levi Primo - Sede Corso Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia (GE). CUP D94I20000040001. CIG A006A28B28"**, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b), comma 5 e comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2) di prendere atto che il minore importo contrattuale di € 1.570,15 oneri fiscali esclusi (€ 1.727,17 oneri fiscali inclusi) determina un nuovo importo contrattuale di € 730.161,22 oneri fiscali esclusi (€ 803.177,34 oneri fiscali inclusi) e trova copertura all'interno delle somme a disposizione del QTE;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico, contenuto in premessa, rimodulato a seguito della presente modifica contrattuale;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio


Servizio Edilizia

- 4) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 5) di dare atto che la sopracitata modifica contrattuale conferma il mantenimento ed il raggiungimento dei target previsti per l'intervento in argomento, il rispetto delle tempistiche e delle milestones del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- 6) di trasmettere la presente modifica contrattuale, in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025, all'Unità di missione;
- 7) di trasmettere il presente atto per conoscenza all'appaltatore economico ATI Geo Prospezioni / Di Giuseppe Osvaldo S.r.l., per gli adempimenti di competenza;
- 8) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**





**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica




CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Corso Trento e Trieste 87, CAP 16019 - Ronco Scrivia (GE)

IIS Primo Levi, Corso Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia (GE)

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO

Progettazione definitiva ed esecutiva

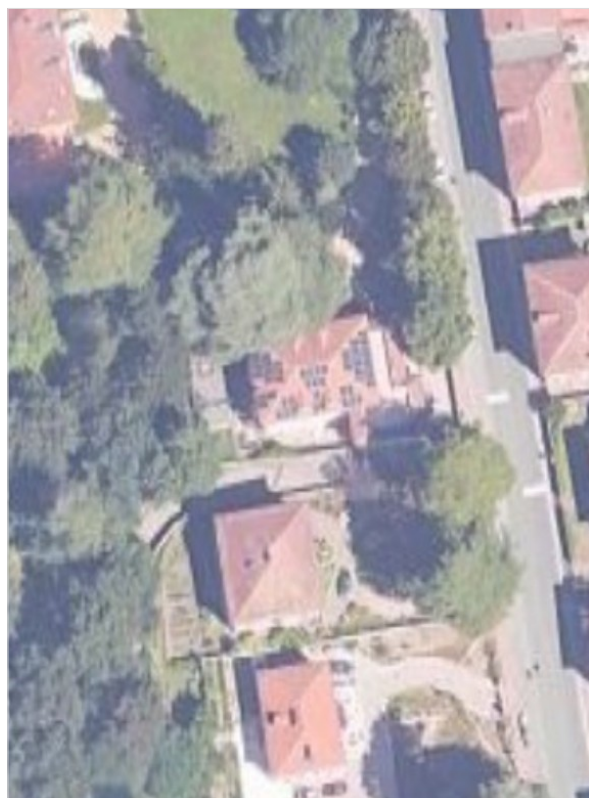

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI

Ing. Luca Moro

Corso Cardinal Federico Borromeo 36,
20822 - Seveso (MB)
345 110 6326
inglucamoro@gmail.com



COLLABORATORE

Arch. Sara Padrone

Corso Cardinal Federico Borromeo 36,
20822 - Seveso (MB)
346 078 2312
sara@studioakantus.it

C.U.P.: D94I20000040001

CONTENUTO TAVOLA
VARIANTE DI PROGETTO

Elenco elaborati grafici

ELABORATO
PRAMM

DATA
Novembre 2025

REV.
REV05

01

INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO SCOLASTICO

I.I.S.S. "PRIMO LEVI"

Via Trento Trieste n.87 Loc. Borgo Fornari - Ronco Scrivia (GE)

Novembre 2025

Elenco degli elaborati

1. ELABORATI AMMINISTRATIVI		
Codice elaborato	Titolo elaborato	Scala
PRAMM_1	Elenco elaborati grafici	--
PRAMM_2	Relazione Tecnica Illustrativa	--
PRAMM_3	Computo Metrico Estimativo Lavorazioni	--
PRAMM_4	Computo Metrico Estimativo Sicurezza	--
PRAMM_5	Analisi dei prezzi	--
PRAMM_6	Computo Metrico Riepilogo Categorie	--
PRAMM_7	Stima Incidenza Manodopera	--
PRAMM_8	Stima Incidenza Sicurezza	--
PRAMM_9	Quadro tecnico economico	--
PRAMM_10	Elenco prezzi unitario	--
PRAMM_11	Quadro economico comparativo	--
PRAMM_12	Relazione ex-Legge 10	--
PRAMM_13	Relazione descrittiva	--

2. RELAZIONI STRUTTURALI		
Codice elaborato	Titolo elaborato	Scala
PRSRel_1	Relazione fotografica	--
PRSRel_2	Elaborato indagini	--
PRSRel_3	Relazione generale strutturale e di calcolo coperture	--
PRSRel_4	Relazione di calcolo - Stato di Fatto	--
PRSRel_5	Relazione di calcolo - Progetto	--
PRSRel_6	Piano di Manutenzione dell'Opera	--

3. ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI		
Codice elaborato	Titolo elaborato	Scala
PRA_00	INQUADRAMENTO	1:100
PRA_01	STATO DI FATTO - Pianta piano terra	1:100
PRA_02	STATO DI FATTO - Pianta piano primo	1:100
PRA_03	STATO DI FATTO - Pianta piano secondo	1:100
PRA_04	STATO DI FATTO - Pianta piano terzo	1:100
PRA_05	VARIANTE - Pianta piano terra	1:100
PRA_06	VARIANTE - Pianta piano primo	1:100
PRA_07	VARIANTE - Pianta piano secondo	1:100
PRA_08	VARIANTE - Pianta piano terzo	1:100
PRA_09	CONFRONTO - Pianta piano terra	1:100

PRA_10	CONFRONTO - Pianta piano primo	1:100
PRA_11	CONFRONTO - Pianta piano secondo	1:100
PRA_12	CONFRONTO - Pianta piano terzo	1:100
PRA_13	STATO DI FATTO - Prospetto NORD	1:100
PRA_14	STATO DI FATTO - Prospetto SUD	1:100
PRA_15	STATO DI FATTO - Prospetto OVEST	1:100
PRA_16	STATO DI FATTO - Prospetto EST	1:100
PRA_17	VARIANTE - Prospetto NORD	1:100
PRA_18	VARIANTE - Prospetto SUD	1:100
PRA_19	VARIANTE - Prospetto OVEST	1:100
PRA_20	VARIANTE - Prospetto EST	1:100
PRA_21	CONFRONTO - Prospetto NORD	1:100
PRA_22	CONFRONTO - Prospetto SUD	1:100
PRA_23	CONFRONTO - Prospetto OVEST	1:100
PRA_24	CONFRONTO - Prospetto EST	1:100
PRA_25	STATO DI FATTO - Sezione AA	1:100
PRA_26	STATO DI FATTO - Sezione BB	1:100
PRA_27	STATO DI FATTO - Sezione CC	1:100
PRA_28	STATO DI FATTO - Sezione DD	1:100
PRA_29	VARIANTE - Sezione AA	1:100
PRA_30	VARIANTE - Sezione BB	1:100
PRA_31	VARIANTE - Sezione CC	1:100
PRA_32	VARIANTE - Sezione DD	1:100
PRA_33	CONFRONTO - Sezione AA	1:100
PRA_34	CONFRONTO - Sezione BB	1:100
PRA_35	CONFRONTO - Sezione CC	1:100
PRA_36	CONFRONTO - Sezione DD	1:100

4. ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI

Codice elaborato	Titolo elaborato	Scala
PRS_1	Riepilogo degli interventi	1:100
PRS_2	Intervento tipologia A - Pilastri	1:100
PRS_3	Intervento tipologia B - C	1:100
PRS_4	Intervento tipologia E - Scala 1:100	1:100
PRS_5	CARPENTERIA PILASTRI - Pianta piano terra	1:100
PRS_6	CARPENTERIA PILASTRI - Pianta piano primo	1:100
PRS_7	CARPENTERIA PILASTRI - Pianta piano secondo	1:100
PRS_8	CARPENTERIA PILASTRI - Pianta piano terzo	1:100

5. ELABORATI ESECUTIVI Relazioni

ESRel_01	Fascicolo dell'opera	--
ESRel_02	Piano di Gestione Ambientale del Cantiere	--
ESRel_03	Piano di Gestione dei Rifiuti	--
ESRel_04	Relazione sui CAM	--

ESRel_05	Relazione sui materiali	--
ESRel_06	Relazione sulla sostenibilità dell'opera	--
ESRel_07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	--
ESRel_08	Cronoprogramma	--
ESRel_09	Relazione Protocollo Nazionale Itaca	--

6. ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI

<i>SCHEDA DI INTERVENTO Strutturale - Pilastri</i>		
ES_S_PT.01	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 6	varie
ES_S_PT.02	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 4	varie
ES_S_PT.03	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 3	varie
ES_S_PT.04	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 1	varie
ES_S_PT.05	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 9	varie
ES_S_PT.06	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 12	varie
ES_S_PT.07	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 13	varie
ES_S_PT.08	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 16	varie
ES_S_PT.09	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 18	varie
ES_S_PT.10	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 19	varie
ES_S_PT.11	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 21	varie
ES_S_PT.12	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 23	varie
ES_S_PT.13	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 14	varie
ES_S_PT.14	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 11	varie
ES_S_PT.15	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 10	varie
ES_S_PT.16	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 22	varie
ES_S_P1.01	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 6	varie
ES_S_P1.02	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 4	varie
ES_S_P1.03	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 3	varie
ES_S_P1.04	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 1	varie
ES_S_P1.05	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 9	varie
ES_S_P1.06	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 12	varie
ES_S_P1.07	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 13	varie
ES_S_P1.08	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 16	varie
ES_S_P1.09	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 18	varie
ES_S_P1.10	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 19	varie
ES_S_P1.11	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 21	varie
ES_S_P1.12	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 23	varie
ES_S_P1.13	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 14	varie
ES_S_P1.14	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 10	varie
ES_S_P1.15	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 22	varie
ES_S_P2.01	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 4	varie
ES_S_P2.02	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 3	varie
ES_S_P2.03	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 1	varie
ES_S_P2.04	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 9	varie
ES_S_P2.05	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 12	varie

ES_S_P2.06	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 13	varie
ES_S_P2.07	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 16	varie
ES_S_P2.08	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 18	varie
ES_S_P2.09	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 19	varie
ES_S_P3.01	P3 Scheda intervento - Pilastro Filo 9	varie
ES_S_P3.02	P3 Scheda intervento - Pilastro Filo 13	varie
<i>SCHEDA DI INTERVENTO Contabilità - Pilastri</i>		
ES_E_PT.01	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 6	varie
ES_E_PT.02	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 4	varie
ES_E_PT.03	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 3	varie
ES_E_PT.04	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 1	varie
ES_E_PT.05	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 9	varie
ES_E_PT.06	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 12	varie
ES_E_PT.07	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 13	varie
ES_E_PT.08	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 16	varie
ES_E_PT.09	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 18	varie
ES_E_PT.10	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 19	varie
PR_E_PT.11	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 21	varie
PR_E_PT.12	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 23	varie
PR_E_PT.13	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 14	varie
PR_E_PT.14	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 11	varie
PR_E_PT.15	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 10	varie
PR_E_PT.16	PT Scheda intervento - Pilastro Filo 22	varie
PR_E_P1.01	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 6	varie
PR_E_P1.02	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 4	varie
PR_E_P1.03	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 3	varie
PR_E_P1.04	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 1	varie
PR_E_P1.05	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 9	varie
PR_E_P1.06	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 12	varie
PR_E_P1.07	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 13	varie
PR_E_P1.08	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 16	varie
PR_E_P1.09	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 18	varie
PR_E_P1.10	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 19	varie
PR_E_P1.11	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 21	varie
PR_E_P1.12	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 23	varie
PR_E_P1.13	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 14	varie
PR_E_P1.14	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 10	varie
PR_E_P1.15	P1 Scheda intervento - Pilastro Filo 22	varie
PR_E_P2.01	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 4	varie
PR_E_P2.02	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 3	varie
PR_E_P2.03	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 1	varie
PR_E_P2.04	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 9	varie
PR_E_P2.05	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 12	varie
PR_E_P2.06	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 13	varie

PR_E_P2.07	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 16	varie
PR_E_P2.08	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 18	varie
PR_E_P2.09	P2 Scheda intervento - Pilastro Filo 19	varie
PR_E_P3.01	P3 Scheda intervento - Pilastro Filo 9	varie
PR_E_P3.02	P3 Scheda intervento - Pilastro Filo 13	varie

<i>7. ELABORATI VIGILI DEL FUOCO</i>		
Codice elaborato	Titolo elaborato	Scala
VVF01	Relazione Tecnica Antincendio di Variante	--
VVF02	Tavola di progetto	1:100
VVF03	Tavola di progetto	1:100
VVF04	Modulo Delega	--
VVF05	PIN Valutazione Progetto	--
VVF06	Pagamento Diritti	--



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAV.23.04 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L'I.I.S PRIMO LEVI DI VIA TRENTO E TRIESTE 87 - RONCO SCRIVIA (GE) - CUP D94I20000040001 - CIG A006A28B28 - PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 1 LETT. B), COMMA 5 E COMMA 7 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	04022.02.	0	2003981	-	1.727,17			210	2024			D94I20000040001	A006A28B28
Note: LAV.23.04 - riduzione impegno di spesa operatore economico ATI GEO PROSPEZIONI / DI GIUSEPPE OSVALDO SRL per minor spesa													
USCITA	04022.02.	0	2003981	+	1.727,17	193	2024					D94I20000040001	
Note: LAV.23.04 reintegrazione a seguito di riduzione impegno n. 21072024													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	0,00								

Genova li, 28/11/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale
